Induamerica	**AREA DE SECADO INDUSTRIAL**	**Marzo**
	Informe interno de mantenimiento correctivo	**2026**

De: Abner Valqui Cadenillas — Sede: Rioja

Para: Dalti Castro Silva — Fecha: 18-Mar-2025

CC Junior Ekan Calle — **de** **O.T**

Código de Máquina o equipo		
Nombre Máquina o Equipo:	>	REPARACION DE MANGUERA
Area	>	SECADO INDUSTRIAL
Marca:	>	
Modelo:	>	
Potencia (kw):	>	
Capacidad:	>	
VOL.	>	-

I. Avería

Calificación criticidad — **Crítica** X — **Importante** ☐ — **Poco importante** ☐ — **Normal** ☐

Naturaleza — **Mecánica** ☐ — **Eléctrica** ☐ — **electrónica** ☐ — **Hidraúlica** ☐ — **Neumatica** ☐ — **Otros** X

Descripción

Se informa que la hidrolavadora cuenta con una manguera de alta presión que, debido a la exigencia operativa, se ha deteriorado y roto en tres partes. Esta situación requiere una reparación urgente para evitar mayores retrasos en las labores.

Asimismo, es necesario realizar una evaluación técnica de la calidad de la manguera, ya que estos inconvenientes se presentan de manera recurrente, afectando directamente el avance de los trabajos de lavado de silos.

Por lo tanto, se solicita al área correspondiente gestionar la adquisición de una manguera nueva que cumpla con los estándares de calidad requeridos para este tipo de operación. Mientras se concreta dicha gestión, se requiere efectuar la reparación provisional de la manguera actual, a fin de garantizar la continuidad de las labores y permitir que el personal desarrolle sus funciones sin mayores interrupciones.

II. ¿Solución?

Realizar una reparación provisional de la manguera (empates o acoples adecuados para alta presión).

Verificar que la reparación soporte la presión de trabajo antes de usarla.

Reemplazar la manguera por una nueva, diseñada específicamente para hidrolavadoras de alta presión.

Asegurarse de que cumpla con:
1. Presión máxima superior a la del equipo.
2. Material reforzado (malla metálica o doble capa).
3. Certificación o garantía de calidad.

II. Causas Indentificadas

1. Presión de trabajo excesiva
2. Baja calidad de la manguera
3. Desgaste por uso continuo
4. Manipulación inadecuada

III. Consecuencias inmediatas, corto y mediano plazo

1. Consecuencias inmediatas
-Paralización parcial o total del lavado de silos.
-Riesgo de accidentes por fuga de agua a alta presión (golpes o cortes).
-Pérdida de tiempo operativo del personal.
Disminución de la productividad en la jornada.
2. Consecuencias a corto plazo
-Retrasos en el cronograma de limpieza.
-Sobrecarga de trabajo al intentar recuperar el tiempo perdido.
-Incremento de costos por reparaciones frecuentes.
-Desgaste del equipo (hidrolavadora) por uso en condiciones inadecuadas.
-Desmotivación del personal por constantes fallas.
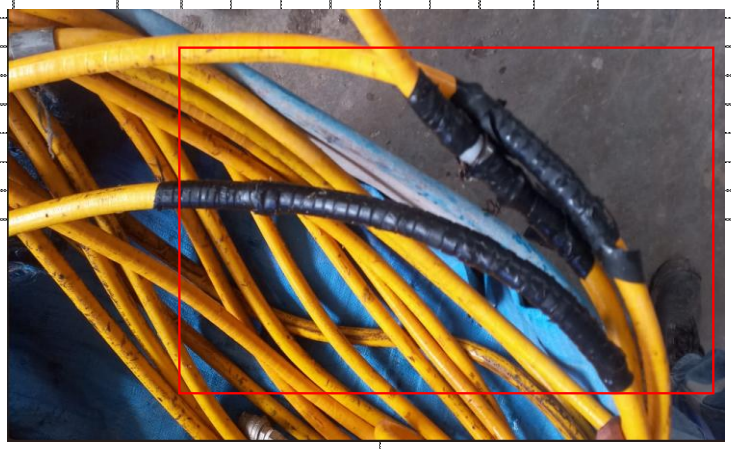
IV. Imagenes de la avería
