induamerica	**DEPARTAMENTE DE MANTENIMIENTO MECÁNICO ELÉCTRICO**	MARZO
	INFORME: Solicitud de mantenimiento controlador de frecuencia REOVIB MFS 158	2026

DE:	Junior Ecan C. - Jefe de Mantenimiento	**SEDE:**	RIOJA
PARA:	Marcos Rioja / Jeleny Bernal	**FECHA:**	23-Mar-26
CC:	Dalti Catro Silva	**O. T.**	005-2026MANT

Marca :	REO ELEKTRONIK AG	**Fecha de Instalación:**	2025
Modelo:	REOVIB MFS 158	**Fecha de ultimo Mtto:**	
Voltaje:	110/240V	**ID:**	615820
Rpm:		**Serie:**	71018.01
HP (Kw):			
Frec:	50/60 Hz		

I. AVERIA:

Calificación Criticidad	Crítica	√	Importante		Poco importante		Normal
Naturaleza	Mecánica		Eléctrica		Electrónica	√	Hidráulica
	Neumática		Otros				

---

1. ANTECEDENTES

El día miércoles 18 de marzo 2026, durante el turno de la tarde, el controlador de vibración **REOVIB** presentó una falla inesperada, provocando la parada inmediata de la maquinaria asociada.

Se realizo el segundo cambio y nuevamente el día sábado 21 de marzo volvió a fallar el segundo equipo.

2. ESTADO ACTUAL

A la fecha, el equipo se encuentra **completamente inoperativo**. Debido a que el REOVIB es un componente crítico para el flujo de alimentación/vibración, la línea de producción permanece **paralizada**, afectando los cronogramas de producción programados.

3. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA

- **Equipo:** Controlador de Vibración REOVIB (MODELO: REOVIB MFS 158).
- **Síntomas:** Sin respuesta de encendido y un sonido en la parte interna.
- **Causa probable:** (Fallo en la etapa de potencia o cortocircuito interno).

4. REQUERIMIENTO

Se solicita con carácter de **URGENCIA** la intervención de mantenimiento correctivo para:

- Diagnóstico electrónico detallado.
- Reparación o sustitución de componentes dañados.
- Pruebas de carga y puesta en marcha.

5. IMPACTO

La persistencia de esta falla mantiene el proceso detenido, generando [mencionar pérdida de unidades o retraso]. Se requiere priorizar esta solicitud para reanudar operaciones a la brevedad.

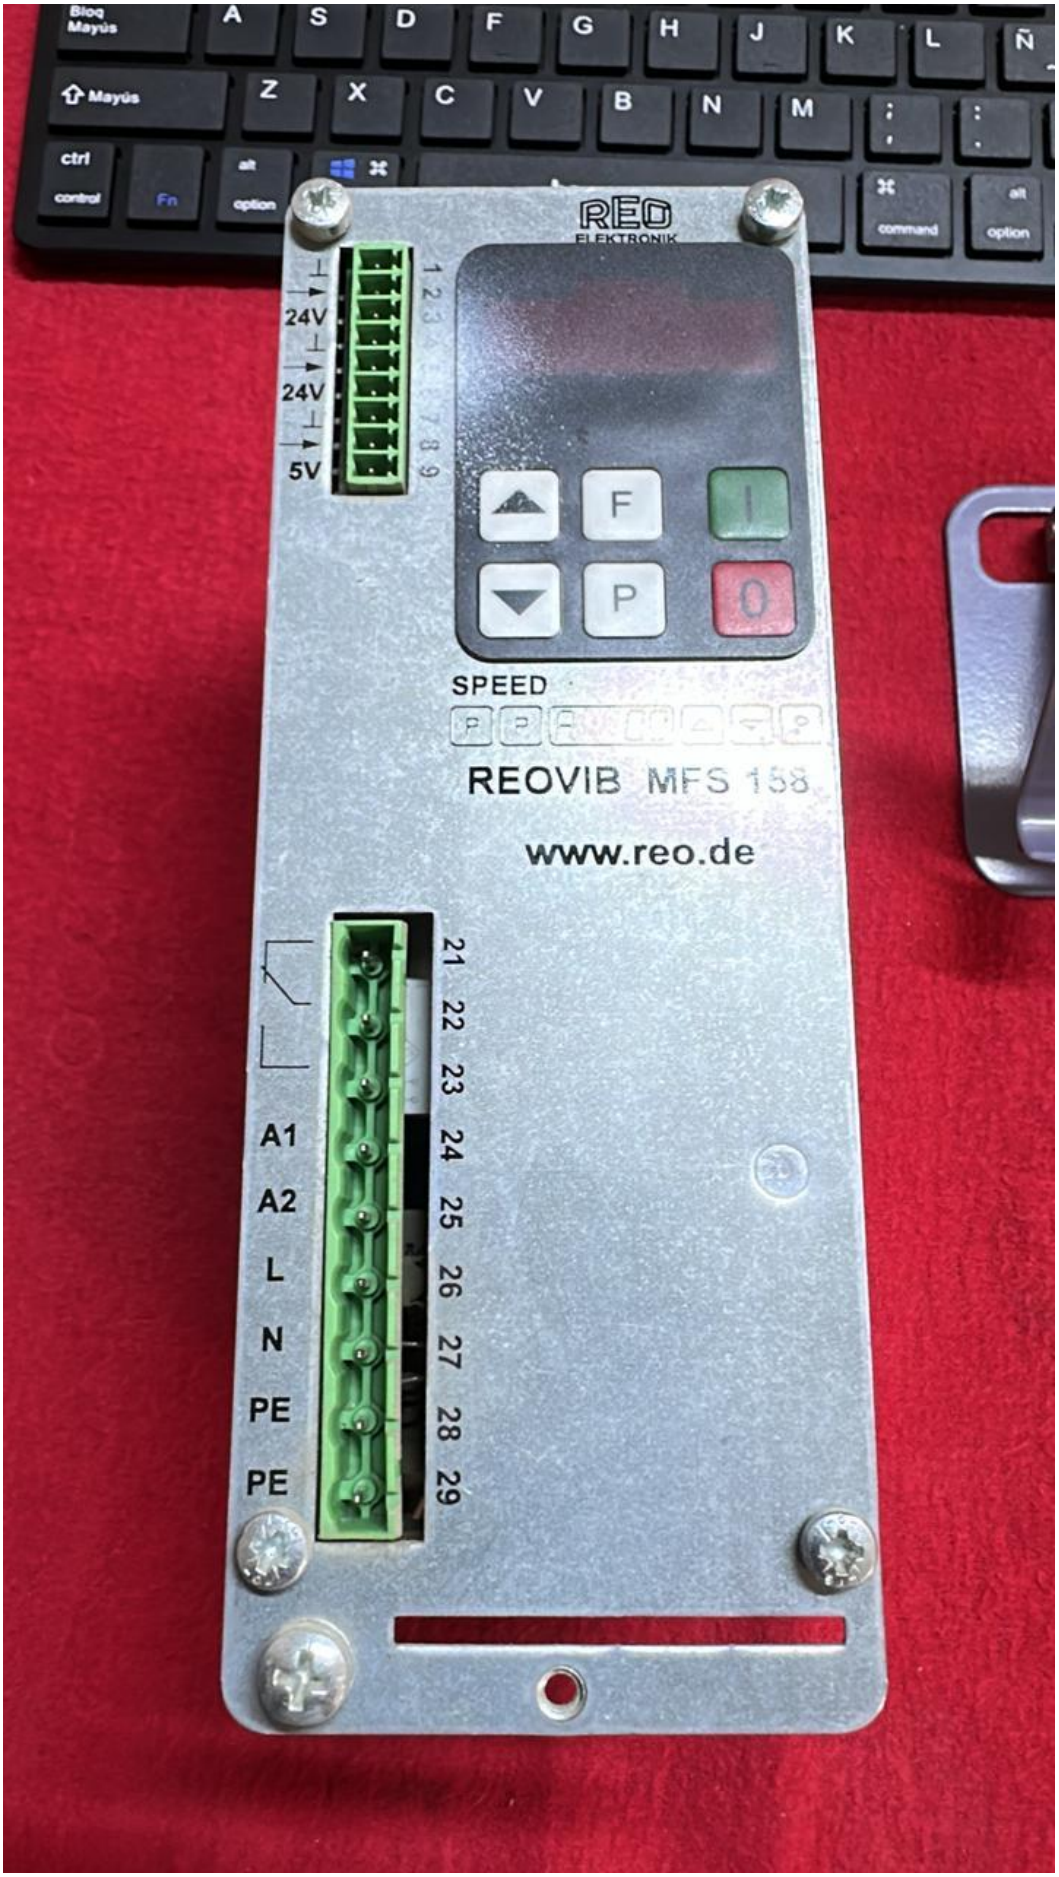
REO
ELEKTRONIK
24V
24V
5V
1 2 3
7 8 9
F
P
SPEED
REOVIB MFS 158
www.reo.de
21
22
23
24
25
26
27
28
29
A1
A2
L
N
PE
PE

ACHTUNG!
VOR DEM ÖFFNEN DES GEHÄUSES
NETZSTECKER ZIEHEN
Vor allen Eingriffen in das Gerät
mindestens 5 min. Entladezeit der
Kondensatoren abwarten

DANGER!
DISCONNECT MAIN SUPPLY
BEFORE REMOVING COVER
Before any contact into the unit wait at
least 5 minutes discharge time of the internal
capacitors

REO ELEKTRONIK AG
Brühler Strasse 100
D - 42657 Solingen
☎ +49(0)212/8804-0
http://www.reo.de

RQS	A-581185		
Nr.	71018.01		
ID	615820		
Type	REOVIB MFS 158		
Uin	110/240V	Fin	50/60Hz
Uout	0-102/205V	Fout	30-140Hz
Iout	4A	43/2014	IP20 CE

FFNEN DES GEHÄUSES
KER ZIEHEN
griffen in das Gerät
5 min. Entladezeit der
en abwarten

CT MAIN SUPPLY
EMOVING COVER
contact into the unit await at
es discharge time of the interna

REO ELEKTRONIK AG
Brühler Strasse 100
D - 42657 Solingen
☎ +49(0)212/8804-0
http://www.reo.de

RQS	A-540986		
Nr.	67871.01		
ID	615820		
Type	REOVIB MFS 158		
Uin	110/240V	Fin	50/60Hz
Uout	0-102/205V	Fout	30-140Hz
Iout	4A	4/2014	IP20 CE

Made in Germany
